7+	宏	ł¥.	唐	#6	'
LOD	谷	1X	Ή	¥Ω	١.

フリガナ	様		固定·携带
お客様名	様	ご連絡先	固定・携帯
設置場所	〒 都·道 市·区 府·県 町·村·郡		
備考			

【製品情報】

製品型式	蓄電システム ESS-U2M1	製造番号	
製品型式	室内リモコン ESS-R3	製造番号	

【別売品製品情報 (オプション品)】※別売品の設置有り案件の場合記入

製品型式	製造番号	
製品型式	製造番号	

【販売会社情報】

フリガナ				固定・携帯
会社名		ご連	連絡先	FAX
住所	〒 都・道 府・県	市·区 町·村·郡	_	
ご担当者様				

【施工会社情報】

上記案件に付、次ページ以降に記載したとおり、工事説明書に準拠し設置工事、 点検を行い、異常なく完了いたしました。

フリガナ				固定·携带				
会社名			ご連絡先	FAX				
住所	〒 都·道 府·県	市·区 町·村·郡						
ご担当者様		ED	ニチコン 施工ID					
点検·検査 結果	良・	否	工事 完了日	20	年	月	日	


※本設置完了報告に記載のお客様、製品、販売会社情報は今後の顧客対応等に使用しますので、 楷書で正確にご記入ください。

【送付先】ニチコン株式会社 電源センター 蓄電システムサービス部 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町14番9号

【敝針記入欄】

1997年11日八個				
営業受付日	サービス処理日		管理No.	
		1		ESS-U2M1設置完了Ver5.2

1. 蓄電ユニットの設置環境、製造番号確認

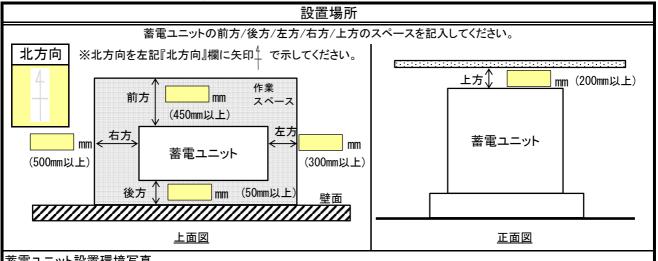

蓄電ユニット設置環境写真

機種銘板の写真(製造番号が読み取れる写真)

【本体(ユニット)】


【リモコン】

2. 併設機器の設置状況確認

確認項目	確認内容		
1. 太陽光発電の有無	有(台) • 無	
2. 太陽光発電パワコンの型式及び	メーカー :	型式:	
適合機種であることの確認	定格出力: kW	ニチコン指定の適合機種であること	
(1. で「有」の場合のみ記入)	メーカー :	型式:	
	定格出力: kW	ニチコン指定の適合機種であること	
3. エコキュートの有無	有(メーカー:	型式:)・無	
4. エネファーム、エコウィルの有無	有(メーカー:	型式:)・無	
5. 上記以外の併設機器(風力発電など)	上記以外の併設機器がありる	ましたら、種類/型式を記入してください。	

3. 蓄電ユニットの電源投入前確認

確認項目		確認内容	チェック
1	DCブレーカ確認	メンテナンス部のDCブレーカが「OFF」になっている	
2	外観確認	傷やへこみ、汚れ、腐食、破損はない	
3	周辺確認	周りにガス、引火物はない	
4	据付け確認	据付け穴4ヶ所を角スペーサ、ワッシャ、ナット でしっかり固定してある	
5	配管確認	PF管3本を所定の位置にサドルでしっかり固定してある	
6	メンテナンス部の引込み口確認	開口部3ヶ所をパテで隙間なく充填してある	
7	メンテナンス部の内部確認	メンテナンス部に、腐食、汚れ、水の侵入はない	
8	ケーブル確認	工事説明書記載のケーブルを使用している	
9	端子台、コネクタの配線接続確認	電線が誤配線なく接続されている。(下図参照) 端子台接続端子のネジにゆるみはない 各ケーブルの被覆が端子台に噛み込んでいない コネクタ(3ヶ所)がしっかりと接続されている	



4. 蓄電ユニットの絶縁抵抗測定

測定方法: 蓄電システムが停止の状態で絶縁抵抗計のレンジをDC500Vに設定し、各端子とE端子間を測定。 判定条件: 各端子の絶縁抵抗が1MΩ以上であること。 __ 停電時出力_L 系統_U 系統_N(0) 停電時出力_N PV自立入力_L PV自立入力_N 系統_W —E間 一E間 一E間 一E間 —E間 —E間 一E間 $\texttt{M}\,\Omega$ ${\tt M}\,\Omega$ $\mathsf{M}\,\Omega$ $\mathsf{M}\,\Omega$ MΩ $\mathsf{M}\,\Omega$ $\mathsf{M}\,\Omega$

5. 蓄電システムの運転確認

試運転モードで、下記の内容を確認した

①設定値の確認 (確認した各種設定を記入)

設定項目	初期値	設定値
アンペアブレーカ値	制限なし	
押上げ設定	未選択	
太陽光発電の有無	有	

②整定値の確認 (確認した整定値を記入)

	整定項目		表示	整定範囲	整定範囲	初期値	整定值
1	交流過電圧検出レベル	•	OVR	110V/115V/120V	0. 5s/1. 0s/2. 0s	115v/1.0s	(v)/ (s)
2	交流不足電圧検出レベ	ル	UVR	80V/85V/90V	0. 5s/1. 0s/2. 0s	80v/1.0s	(v)/ (s)
2	周波数上昇検出レベル	50Hz	0FR	50. 5Hz/51. 0Hz/51. 5Hz	0. 5s/1. 0s/2. 0s	51.0Hz/1.0s	(Hz)/ (s)
٥	3 周波数工弁快出レベル	60Hz	UFK	60. 6Hz/61. 2Hz/61. 8Hz	0. 5s/1. 0s/2. 0s	61. 2Hz/1. 0s	(Hz)/ (s)
1	1 周波数低下検出レベル	50Hz	UFR	47. 5Hz/48. 0Hz/48. 5Hz/49. 0Hz/49. 5Hz	0. 5s/1. 0s/2. 0s	48. 5Hz/1. 0s	(Hz)/ (s)
	周	60Hz	UI IX	57. 0Hz/57. 6Hz/58. 2Hz/58. 8Hz/59. 4Hz	0. 5s/1. 0s/2. 0s	58. 2Hz/1. 0s	(Hz)/ (s)
5	受動的方式		PAS	±10° /±15° /±20°	_	±10	•
6	復帰時限		HLd	10(秒) /60(秒) /150(秒) /300(秒)	1	300(秒)	(秒)

③端子電圧の確認 (蓄電ユニットの端子台の電圧を測定)

	測定方法:	蓄電システムを運転状態にして、端子台の各端子をテスターで測定								
	判定条件:	件: 系統_U一系統_W ··· 202V±20V 系統_N(0) - E間 ··· 1V以下 その他 ···								
系統_U 系統_		系統_W	系統U	停電時出力_L	系統_N(0)					
	-系統_N(0)間	一系統_N(0)間	一系統_W間	-停電時出力_N間	一E間					
V		<u> </u>	V	V	V					

④各動作の確認(室内リモコンで確認)

運転モード	チェック
充電	
放電	
停電時切替、放電動作	
点検コードは発報していない(発報時は対処する)	

6. 蓄電システムの設置日登録の確認 (「登録情報」画面で確認)

蓄電システム 設置日	年	月	日	

7 お客様への説明(既入居の場合のみ)

<u> </u>		
	ご説明事項	チェック
1	各運転モード、非常運転モードの説明を行った	
2	運転モード、非常運転モードの設定方法を説明した	
3	充電開始、放電開始時間の設定方法を説明した	
4	停電時の家電製品利用時の注意事項を説明した(医療機器や瞬停の影響を受ける機器はつながない)	
